

# ÇORUM İLİ 2017 YILI YATIRIMLARI

## KUZEY YERLEŞKE ÇALIŞMALARI



Kuzey Yerleşke Alanı toplam **193 ha**'a ulaşmış olup, bu taşınmazların **178 ha** kısmının tahsis/ön izin ve kamulaştırma süreçleri tamamlanmıştır.

Kuzey Yerleşke Master Plan çalışmaları tamamlanmış, revizyon imar planı Çorum Belediyesi tarafından onaylanmıştır.

İmar Alanı içerisindeki taşınmazların tevhid işlemi devam etmektedir.



## KUZEY KAMPÜS MASTER PLANI



Kuzey Kampüs 1. Etap Yapım ihalesi **22 Mayıs 2014** tarihinde gerçekleştirilmiş, **27 Eylül 2014** tarihinde sözleşme imzalanarak yapımına başlanmıştır. 2017 Haziran ayı sonu itibariyle **%45,48** fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

## ISI VE ENERJİ MERKEZİ BİNALARI



**Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı içerisinde ihale edilmiştir.**

**1,2 MW Trijenerasyon Sistemi yapılacaktır. (Elektrik + Isıtma + Soğutma)**

**Geçici Kabul çalışmaları devam etmektedir.**



## KAPALI SPOR SALONU



SPOR SALONU

**Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı içerisinde ihale edilmiş olup, 8.600 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir.**

**Geçici Kabul çalışmaları devam etmektedir.**



## İLÂHİYAT FAKÜLTESİ



İLÂHİYAT FAKÜLTESİ BİNASI

Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı içerisinde ihale edilmiş olup, **18.150 m<sup>2</sup>** kapalı alana sahiptir.

Sözleşme tarihinden itibaren **1448 gün** (Ağustos 2018) içinde yapımının tamamlanması planlanmıştır.



## İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ



İİBF BİNASI

**Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı içerisinde ihale edilmiş olup, 20.200 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir.**

**Sözleşme tarihinden itibaren 1448 gün (Ağustos 2018) içinde yapımının tamamlanması planlanmıştır.**



## GÜNEY YERLEŞKE ALANI ÇALIŞMALARI



Güney Yerleşke İmar alanı 461.500 m<sup>2</sup>'dir. Yerleşkede yer alan taşınmazların 7.050 m<sup>2</sup>'si Üniversitemiz mülkiyetinde olup; 155.521 m<sup>2</sup>'lik kısmı Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Üniversitemize tahsis edilmiş, orman nitelikli 257.346,34 m<sup>2</sup> taşınmaz için Orman Genel Müdürlüğünden ön izin alınmıştır.

Güney Yerleşke Master Plan ihalesi 20.01.2017 tarihinde yapılmış olup, proje süreci devam etmektedir.



## SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ



İhale tarihi	: 8 Nisan 2014
Sözleşme Tarihi	: 20 Mayıs 2014
Sözleşme Bedeli	: 16.323.000 TL
İşin Süresi	: 1.195 Gün
Tahmini Bitiş	: Eylül 2017

**Fiziki Gerçekleşme: % 70**

İdari-Derslik Binası	: 9.067 m <sup>2</sup>
Kapalı Otopark	: 555 m <sup>2</sup>
Kantin-Yemekhane	: 1.230 m <sup>2</sup>
Trafo-Enerji Mrk.	: 460 m <sup>2</sup>
Isı Merkezi	: 1.106 m <sup>2</sup>
<b>Toplam Kapalı Alan:</b>	<b>12.418 m<sup>2</sup></b>



## OĐUZLAR BESYO SU SPORLARI MERKEZİ



**Projelendirme çalışmalarını tamamlanmış olup, 2017 Yatırım Programına alınmıştır. Kısa süre içerisinde ihale edilerek yapımına başlanması planlanmaktadır.**

# Merkez 16 Derslikli Anadolu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi



Proje No	Proje Bedeli	Ödeneği	Proje Özelliği	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
MEB 2004 72	3.535.280	3.652.000	Özel Proje	%100	Tamamlandı

## Merkez 16 Derslikli Ulukavak Mahallesi İlkokulu



Proje No	Proje Bedeli	ÖdeneĐi	Proje ÖzelliĐi	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
MEB	4.953.24	4.953.244	MEB 2014/16	%5	

## İskilip 16 Derslikli İHO



Proje No	Proje Bedeli	ÖdeneĐi	Proje ÖzelliĐi	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
MEB	3.007.820	3.007.820		%5	

## İskilip 24 Derslikli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi



Proje No	Proje Bedeli	Ödeneği	Proje Özelliği	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
ÖZEL	8.500.000	4.275.000	ÖZEL		

## Alaca 16 Derslikli İlkokulu



Proje No	Proje Bedeli	ÖdeneĐi	Proje ÖzelliĐi	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
MEB	2.966.520	2.966.520		%5	

## Alaca 24 Derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi



Proje No	Proje Bedeli	Ödeneği	Proje Özelliği	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
ÖZEL	7.500.000	4.250.000	Özel Proje	%5	





Proje No	Proje Bedeli	Ödeneđi	Proje Özelliđi	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
MEB	8.750.000	8.750.000	MEB 2014/32	%30	

## Mecitözü 24 Derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi



Proje No	Proje Bedeli	ÖdeneĐi	Proje ÖzelliĐi	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
ÖZEL	7.500.000	5.060.000	Özel Proje	%80	



Proje No	Proje Bedeli	ÖdeneĐi	Proje ÖzelliĐi	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
MEB	6.750.000	1.800.000	2014/16	%5	



Proje No	Proje Bedeli	ÖdeneĐi	Proje ÖzelliĐi	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
MEB	4.500.000	1.566.883	MEB/100	%5	

## Merkez 16 Derslikli Fatih Sultan Mehmet İHO

Proje No	Proje Bedeli	Ödeneği	Proje Özelliği	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
MEB	4.953.244	4.953.244	MEB 2014/16 İHO		İhalesi Ve Yer Teslimi Yapıldı

## Merkez 16 Derslikli Özel Eğitim İlkokulu

Proje No	Proje Bedeli	Ödeneği	Proje Özelliği	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
MEB	4.154.000	3.000.000	MEB		İhalesi Ve Yer Teslimi Yapıldı

## Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu

Proje No	Proje Bedeli	Ödeneği	Proje Özelliği	Fizik Gerçekleşme	Açıklama
MEB	1.500.000	975.000	MEB 2004/63		İhalesi Ve Yer Teslimi Yapıldı

## İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ DEVAM EDEN PROJELER

	İşin Adı	Proje No	Açıklama
1	Uğurludağ İlkokulu	16 Derslik	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
2	Yavuz Sultan Selim İlkokulu	16 Derslik	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
3	Ö.Salim Akaydın Ortaokulu	18 Derslik	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
4	Yahya Kemal Beyathı İlkokulu	16	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
5	Merkez Anaokulu	8	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
6	Yeni Ulukavak Ortaokulu	24 Derslikli	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
7	Karakeçili Ortaokulu	24 Derslikli	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
8	Aşağıörenseki İlkokulu	8 Derslikli	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
9	Bilim Sanat Merkezi	16 Derslikli	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
10	Osmancık İHO	16 Derslikli	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
11	Yıldırım Beyazıd İHO	16 Derslikli	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
12	Kargı İlkokulu	8 Derslikli	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor
13	Özel Eğitim Okulu	12 Derslik	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor

## Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma Hastanesi




2017 Yılı Biten Projeler

Proje Toplam  
Tutarı


Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma Hastanesi (800 Yatak)

223.063.628

## Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma Hastanesi

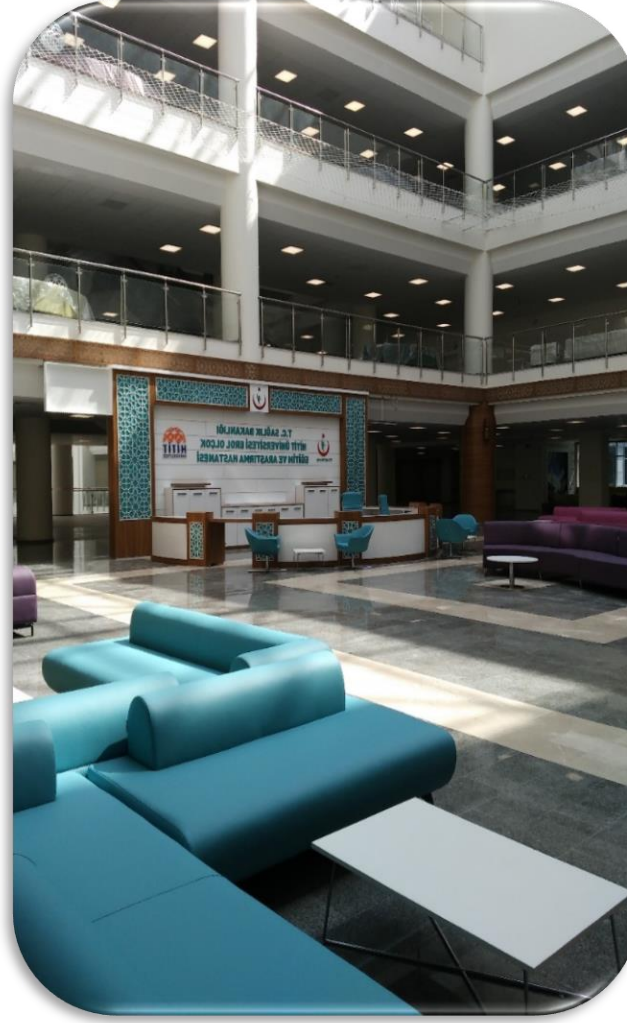



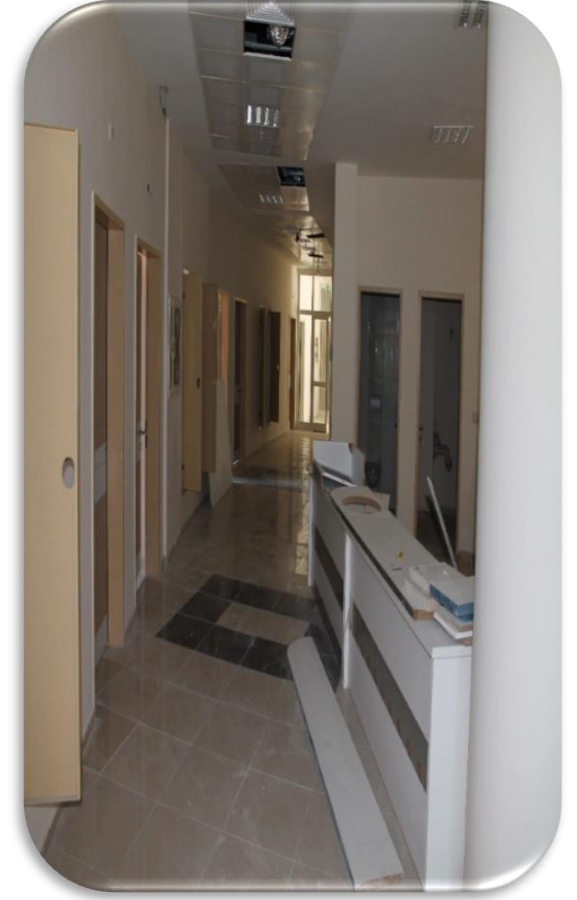

2017 Yılı Devam Etmekte Olan Projeler

Proje Toplam Tutarı

İskilip Devlet Hastane Binası Yapım İşi (100 Yatak)

25.672.000



2017 Yılı Devam Etmekte Olan Projeler

Proje Toplam Tutarı

Bayat Devlet Hastanesi(30 Yatak) Ek Bina Yapımı İkmal İnşaatı

16.154.947



2017 Yılı Devam Etmekte Olan Projeler

Proje Toplam Tutarı


Çorum Sağlık Kompleksi ve 112 KKM İnşaatı

23.355.740

2017 Yılı Henüz Başlanamamış Projeler	Proje Toplam Tutarı
Sungurlu İlçesi 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ Yapım İşi	3.500.000
İskilip İlçesi 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ Yapım İşi	2.500.000
Merkez Ulukavak Mah. 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ Yapım İşi	1.250.000
Merkez Yavruturna Mah. 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ Yapım İşi	1.250.000

2017 Yılı İhale Aşamasında Olan Projeler	Proje Toplam Tutarı
Osmancık İlçesi 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi Yapım İşi	2.000.000
Mecitözü İlçesi 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi Yapım İşi	2.000.000

## ÇORUM İLİ DEVAM EDEN İŞLER HARİTASI

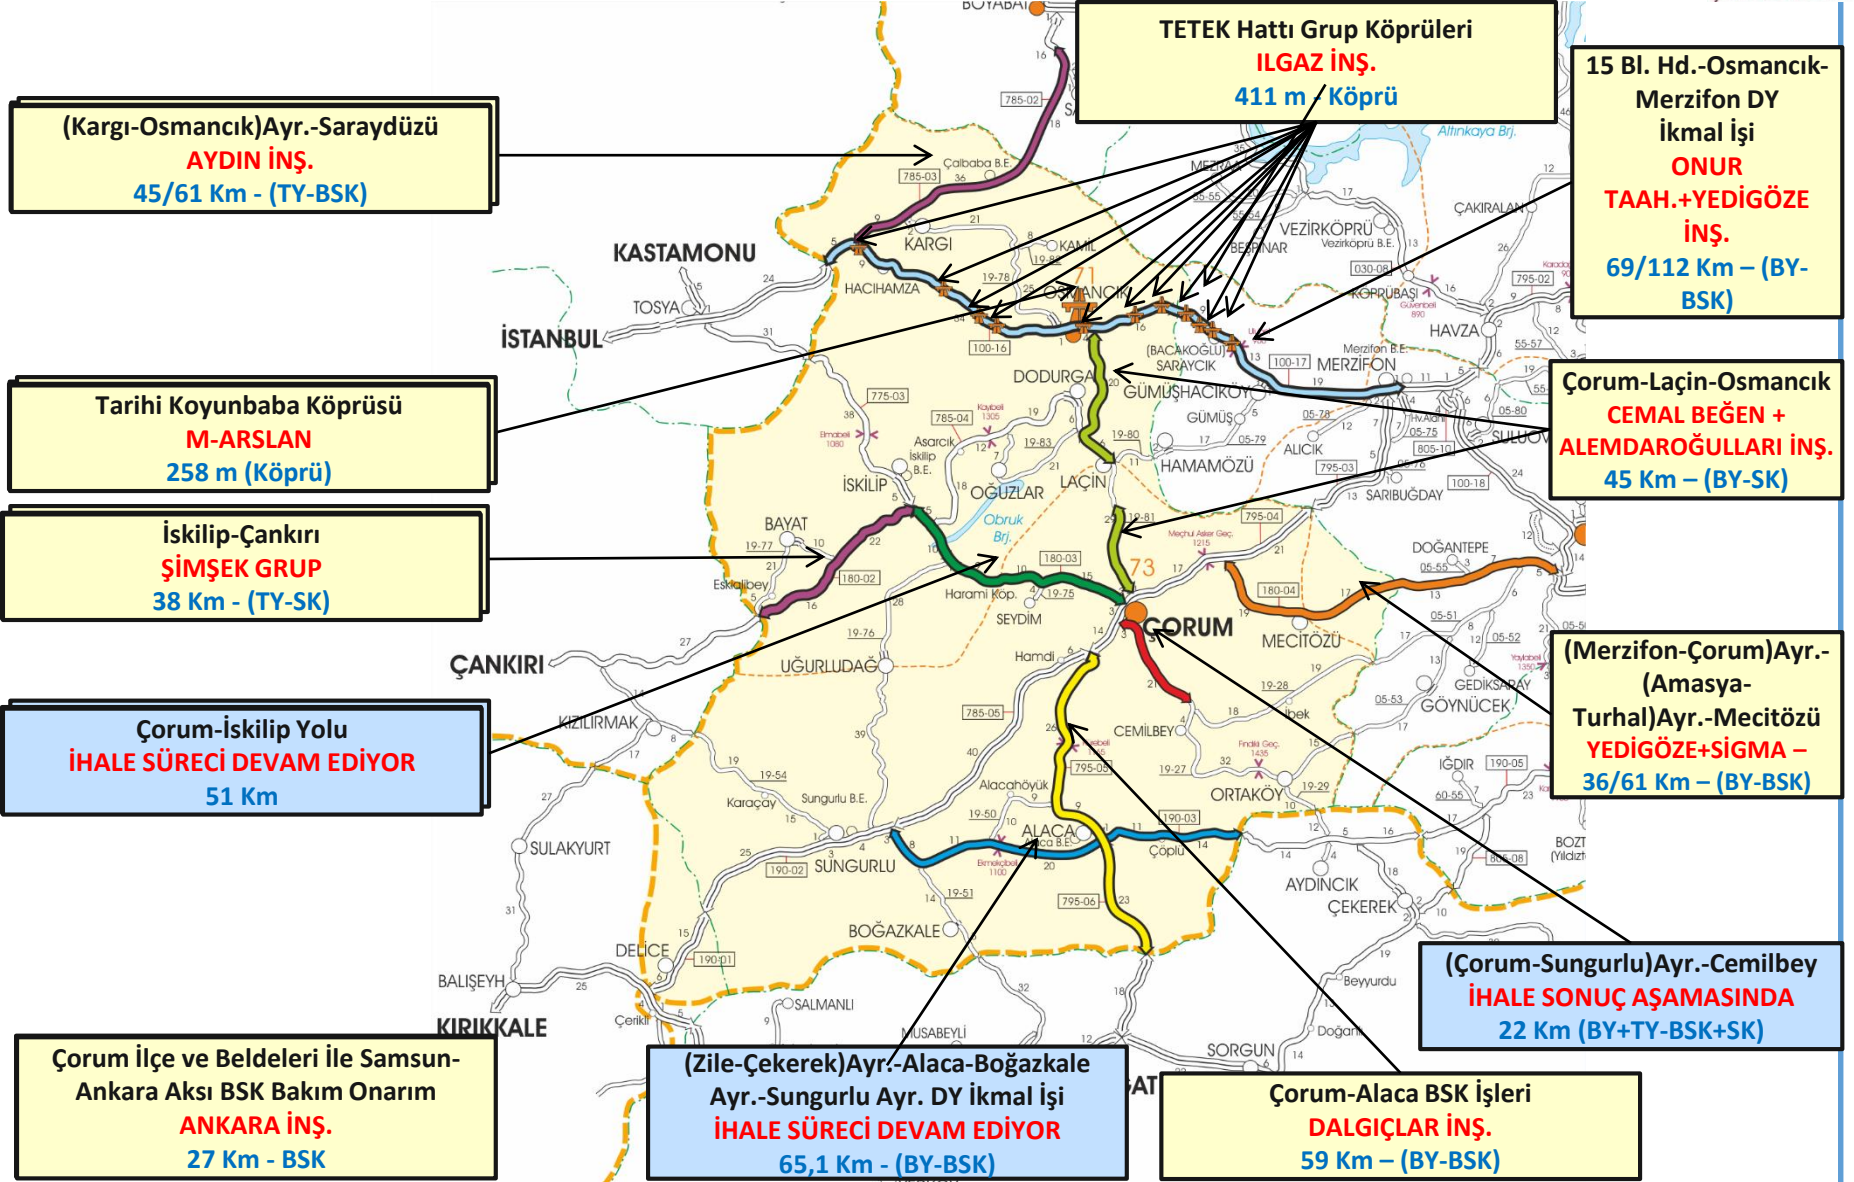

## 15 Bölge Hududu-Osmancık-Merzifon DY İkmal İşi



**Yolun Uzunluğu :** 112 Km BY-BSK

**Müteahhidi :** ONUR TAAH.TAŞ.İNŞ.VE  
SAN.AŞ.+YEDİGÖZE İNŞ.DAN.OT.İÇ VE  
DİŞ TİC.LTD.ŞTİ

**İhale Bedeli :** 195.832.520  
TL

**Toplam İhale Bedeli :** 195.832.520 TL  
**Tenzilatı (%) :** 21,9

**Proje Bedeli :** 255.000.000  
TL

**Başlama ve Bitiş Tarihleri :** 08.05.2017 – 24.12.2019

**2016 Sonu Toplam Harcama :** -

**Sene Başı Ödeneği :** 10.000.000  
TL

112 Km'lik yolda BY çalışmalarına 2007 yılında başlanılarak 2012 yılında tamamlanmıştır. 06.03.2017 tarihinde ikmal ihalesi yapılan bu iş kapsamında Badal Tüneli (2x850 m), eksik kalan hemzemin kavşakların tanzimi ve BSK imalatlarının yapılması ile Beygircioğlu, Osmancık-Çorum ayrımı, Gümüşhacıköy ve Merzifon Organize Sanayi farklı seviyeli kavşakları ve Osmancık şehir geçişinin yapılması bulunmaktadır.

2017 yılı içerisinde Gümüşhacıköy-Merzifon arasında 8 Km SK>BSK'nın bitirilmesi ve Gümüşhacıköy farklı seviyeli kavşağında çalışılması hedeflenmektedir.

Proje ve kamulaştırma revize çalışmaları devam etmektedir.

## Çorum-Osmancık Yolu Çorum-Laçın Arası (Km: 0+200-18+299) ve (Osmancık-Merzifon) Ayr.-Laçın Arası (0+000-25+306) Yapım İşİ



<b>Yolun Uzunluğu :</b>	<b>43,4 Km BY-BSK</b>	
<b>İhale Bedeli :</b>	<b>58.730.650 TL</b>	
<b>Toplam İhale Bedeli :</b>	<b>58.730.650 TL</b>	<b>Tenzilatı (%) : 55,9</b>
<b>Proje Bedeli :</b>	<b>72.978.124 TL</b>	
<b>Başlama ve Bitiş Tarihleri :</b>	<b>24.12.2015 – 27.05.2019</b>	
<b>Sene Başı Ödeneği :</b>	<b>7.500.000 TL</b>	
<b>2017 Toplam İmalat :</b>	<b>5.250.001 TL</b>	
<b>2017 Yılı Harcanan :</b>	<b>4.250.001 TL</b>	
<b>Toplam Harcama :</b>	<b>7.476.315 TL</b>	
<b>Fiziksel Gerçekleşme :</b>	<b>% 9</b>	
<b>2017 Yılı Par. Hed. Gerç. :</b>	<b>% 57</b>	

Çorum-Laçın Arası (Km: 0+200-18+299) 18 km uzunluğunda ve (Osmancık-Merzifon) Ayr.-Laçın Arası (Km: 0+000-25+306) 25,3 km uzunluğunda olmak üzere toplam 44 km uzunluğundaki SK-BY standardında olan yolda, yapım çalışmalarına 24.12.2015 tarihinde başlanılmıştır.

İhale bünyesinde toprak işleri, sanat yapıları, 64 m 1 adet çift köprü, 20 m 1 adet tek köprü ve üstyapı işleri (SK) bulunmaktadır.

2016 yılı içerisinde Km: 22+300-23+500 arasındaki 1,2 km lik kesimde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalar yapılmıştır.

2017 yılı içerisinde Km:8+960-23+500 arasında kalan muhtelif kesimlerde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işlerinde çalışmalar yapılması ve Km:20+566 da yer alan arkıt çayı köprüsünün yapımı planlanmakta olup bu aralıkta kalan 4,5 km'lik kesimin SK seviyesinde trafiğe açılması hedeflenmektedir.

2017 yılında Km:8+960-15+100 arasındaki 6,14 km'lik kesimde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalara başlanılmış olup halen devam etmektedir. Ayrıca Eymir varyantında Km:12+480-17+340 arasında kalan kesimde toprak işlerinde çalışmalara başlanılmıştır.

Aynı güzergah üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişinde 8,6 km'lik BY proje çalışması devam etmekte olup proje kapsamında 3 adet toplam uzunluğu 4077 m olan çift tüp tünel bulunmaktadır.

## (Çorum-İskilip)Ayr.-(Ankara-Çankırı) Ayr. (2. Kısım) Yolu Yapım İşi



<b>Yolun Uzunluğu :</b>	<b>38,2 Km 1A-SK</b>	
<b>İhale Bedeli :</b>	<b>47.172.648 TL</b>	
<b>Toplam İhale Bedeli :</b>	<b>47.172.648 TL</b>	<b>Tenzilatı (%) : 52,5</b>
<b>Proje Bedeli :</b>	<b>63.785.596 TL</b>	
<b>Başlama ve Bitiş Tarihleri :</b>	<b>28.08.2015 – 17.08.2018</b>	
<b>Sene Başı Ödeneği :</b>	<b>17.000.000 TL</b>	
<b>2017 Toplam İmalat :</b>	<b>8.696.032 TL</b>	
<b>2017 Yılı Harcanan :</b>	<b>7.696.032 TL</b>	
<b>Toplam Harcama :</b>	<b>33.286.044 TL</b>	
<b>Sözl. Fiy. ile Yap.Top. İş Tutarı :</b>	<b>22.856.722 TL</b>	
<b>Fiziksel Gerçekleşme :</b>	<b>% 54</b>	
<b>2017 Yılı Par. Hed. Gerç. :</b>	<b>% 51</b>	

38 km uzunluğundaki (Km: 47+650–85+817) SK-1A standardında olan yolda, yapım çalışmalarına 28.08.2015 tarihinde başlanılmıştır. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 190 m olan 4 adet tek köprü bulunmaktadır.

2016 yıl sonu itibariyle, Km: 47+800-58+000 arasındaki 10,2 km’lik kesimde ve 68+000-85+817 arasındaki 17.8 km’lik kesimde muhtelif kesimlerde toprak işlerinde ve sanat yapılarında çalışılmıştır.

2017 yılı içerisinde Km: 54+000-58+000 arasındaki 4 km’lik kesimde ve Km: 68+000-84+000 arasındaki 16 km’lik kesimde toprak işlerinde ve sanat yapılarında çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonu itibari ile, Km: 64+817-85+817 arası 21 kmlik kesimin TY SK seviyesinde tamamlanıp trafiğe açılması hedeflenmektedir. Ayrıca, 3 adet köprüünün (Bayatdere Köprüsü, Kayaagzı Köprüsü ve Meydançayı Köprüsü) 2017 yıl sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.



## Amasya İl Hd.-Çorum-Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK Onarımı, Çorum İli ve İlçe Şehir Geçişleri İle Hamamözü Geçişinin BSK Yapılması



**Yolun Uzunluğu** : 15,2 Km BY-BSK + 11 Km TY-BSK

**Toplam İhale Bedeli** : 8.919.100 TL

**Proje Bedeli** : 12.909.375 TL

**Başlama ve Bitiş Tarihleri** : 01.06.2015 – 22.06.2017

**2017 Yılı Ödenegi** : 4.827.000 TL

**2017 Toplam İmalat** : 2.360.000 TL

**2017 Yılı Harcanan** : 1.800.000 TL

**Toplam Harcama** : 8.709.375 TL

**Sözl. Fiy. İle Yap.Top. İş Tutarı** : 6.500.073 TL

**Fiziksel Gerçekleşme** : % 72

**2017 Yılı Par. Hed. Gerç.** : % 49

14.04.2015 tarihinde üstyapı ihalesi yapılan yolda yapım çalışmalarına 1 Haziran 2015 tarihinde başlanılmıştır. Proje bünyesinde Çorum İlinin Dodurga, Oğuzlar, Boğazkale İlçelerinin Şehir Geçişleri ile Amasya'nın Hamamözü ilçesinin Şehir Geçişinin BSK yapılması ve Çorum – Sungurlu – Delice Devlet Yolunun BSK onarımı bulunmaktadır.

2016 yıl sonu itibariyle Dodurga İlçesi Şehir Geçışı (1 Km BY, 1 Km TY) aşınma, Hamamözü İlçesi Şehir Geçışı (2 Km TY) aşınma, Boğazkale (1,3 Km) binder, Oğuzlar Şehir Geçışı (2,2 Km) aşınma, Çorum Şehir Geçışı (1,8 Km BY) aşınma olmak üzere toplam 9,3 km'lik kesim tamamlanmıştır.

2017 yılı içerisinde Çorum Şehir Geçışı 1,2 Km BY aşınma seviyesinde tamamlanmış olup, Boğazkale 1,3 Km. TY, Cemilbey 1,2 Km BY ve Çorum – Sungurlu – Delice Devlet Yolu 10 Km BY onarım olmak üzere toplam 12,5 km'lik kesim aşınma seviyesinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Boğazkale 1,2 Km.lik kesimde sanat yapıları (Yüzeysuyu drenajı, bordür ve tretuvar), Çorum – Cemilbey yolu 1,2 Km.lik kesimde toprak işleri ile Çorum – Sungurlu Devlet Yolu 10 Km.lik kesimde BSK onarım çalışmalarına başlanılmıştır.

## (Çorum-Sungurlu) Ayr. – (Alaca-Yozgat)Ayr. Yolu ( Km: 0+000 – 58+700 )



<b>Yolun Uzunluğu :</b>	<b>58,7 Km</b>	<b>BSK-BY</b>
<b>İhale Bedeli :</b>	<b>74.769.807</b>	<b>TL</b>
<b>Toplam İhale Bedeli :</b>	<b>74.769.807</b>	<b>TL</b>
<b>Proje Bedeli :</b>	<b>107.650.000</b>	<b>TL</b>
<b>Başlama ve Bitiş Tarihleri :</b>	<b>08.10.2014 – 29.01.2019</b>	
<b>2016 Sonu Toplam Harcama :</b>	<b>23.650.000</b>	<b>TL</b>
<b>Sene Başı Ödeneği :</b>	<b>20.000.000</b>	<b>TL</b>
<b>2017 Toplam İmalat :</b>	<b>8.000.000</b>	<b>TL</b>
<b>2017 Yılı Harcanan :</b>	<b>8.000.000</b>	<b>TL</b>
<b>Toplam Harcama :</b>	<b>31.650.000</b>	<b>TL</b>
<b>Fiziksel Gerçekleşme :</b>	<b>% 29</b>	
<b>2017 Yılı Par. Hed. Gerç. :</b>	<b>% 40</b>	

58.7 km uzunluğundaki (Km: 0+000 – 58+ 700 ) BSK BY standardında olan yolda, yapım çalışmalarına 27.08.2015 tarihinde başlanılmıştır. Proje bünyesinde 22 adet hemzemin, 1 adet farklı seviyeli kavşak bulunmaktadır. 2016 yıl sonu itibariyle bölünmüş yol olarak 14,5 km’lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır. 2017 yılı içerisinde bölünmüş yol olarak 27,5 km lik kesimin aşınma seviyesinde tamamlanması hedeflenmektedir. 2017 yılı içerisinde 4 km’lik kesim bölünmüş yol olarak binder seviyesinde, 7,5 km’lik kesim ise bölünmüş yol olarak bitümlü temel seviyesinde tamamlanmıştır. Diğer kesimlerde yapım çalışmalarımız devam etmektedir.

## (Kargı-Osmancık)Ayr. – Saraydüzü Yolu



<b>Yolun Uzunluğu :</b>	<b>59,9 Km 1A-BSK</b>
<b>İhale Bedeli :</b>	<b>1.207.354 TL</b>
<b>Toplam İhale Bedeli :</b>	<b>5.297.917 TL</b>
<b>Proje Bedeli :</b>	<b>400.000.000 TL</b>
<b>Başlama ve Bitiş Tarihleri :</b>	<b>15.03.1998 – 31.12.2019</b>
<b>2016 Sonu Toplam Harcama :</b>	<b>263.039.393 TL</b>
<b>Sene Başı Ödeneği :</b>	<b>5.000.000 TL</b>
<b>2017 Toplam İmalat :</b>	<b>7.144.975 TL</b>
<b>2017 Yılı Harcanan :</b>	<b>3.737.305 TL</b>
<b>Toplam Harcama :</b>	<b>266.776.698 TL</b>
<b>Sözl. Fiy. İle Yap.Top. İş Tutarı :</b>	<b>5.242.770 TL</b>
<b>Fiziksel Gerçekleşme :</b>	<b>% 68</b>
<b>2017 Yılı Par. Hed. Gerç. :</b>	<b>% 143</b>


60 Km uzunluğundaki (Km:9+000-0+000-51+733) BSK-1A standardında olan yolda, yapım çalışmalarına 15.03.1998 tarihinde başlanılmıştır. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 56 m olan 2 adet tek köprü (Karakise ve Karaçay Köprüleri) ve 1 adet hemzemin kavşak bulunmaktadır. Projenin 45 Km'si Çorum ili sınırlarında, 15 Km'si ise Sinop ili sınırları içerisinde kalmaktadır.

2016 yıl sonu itibariyle 60 Km'lik kesim TY olarak (60 Km binder seviyesinde, 1,4 Km Aşınma Seviyesinde) tamamlanmıştır. Km: 5+200'de bulunan ve uzunluğu 31 m olan Karaçay Köprüsü ile Km:8+397'de bulunan ve uzunluğu 25 m olan Karakise Köprüsü tamamlanmıştır. Ayrıca, Km: 0+000'da Kargı girişinde yer alan hemzemin kavşak tamamlanmıştır.

2017 Yılı içerisinde Km:27+000, 31+400 ve 31+740'da yer alan heyelanlarda ıslah çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

15.02.2017 tarihli Bakan Oluru ile keşif artışı alınmış olup, Kargı Kavşağı-Beygircioğlu kavşağı arasında (Km:0+000-8+930) kalan kesim tek yoldan bölünmüş yola çevrilecektir.

## (Çorum-Merzifon)Ayr.-Mecitözü-(Amasya-Turhal) Ayr. Yolu

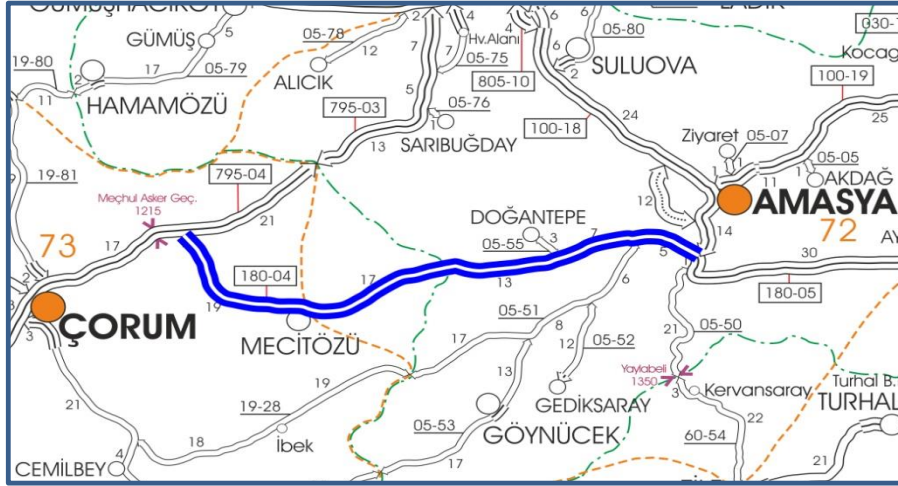

**Yolun Uzunluğu :** 61,8 Km BY-BSK

**İhale Bedeli :** 247.085.932 TL

**Toplam İhale Bedeli :** 247.085.932 TL

**Proje Bedeli :** 350.000.000 TL

**Başlama ve Bitiş Tarihleri :** 28.02.2017 – 31.12.2019


**Sene Başı Ödeneği :** 5.000.000 TL

**2017 Toplam İmalat :** 350.000 TL

**Fiziksel Gerçekleşme :** % 1

**2017 Yılı Par. Hed. Gerç. :** % 7

## Tetek Hattı Grup Köprülerinin Yapımı Ve Muhtelif Köprülerin Onarım İşi

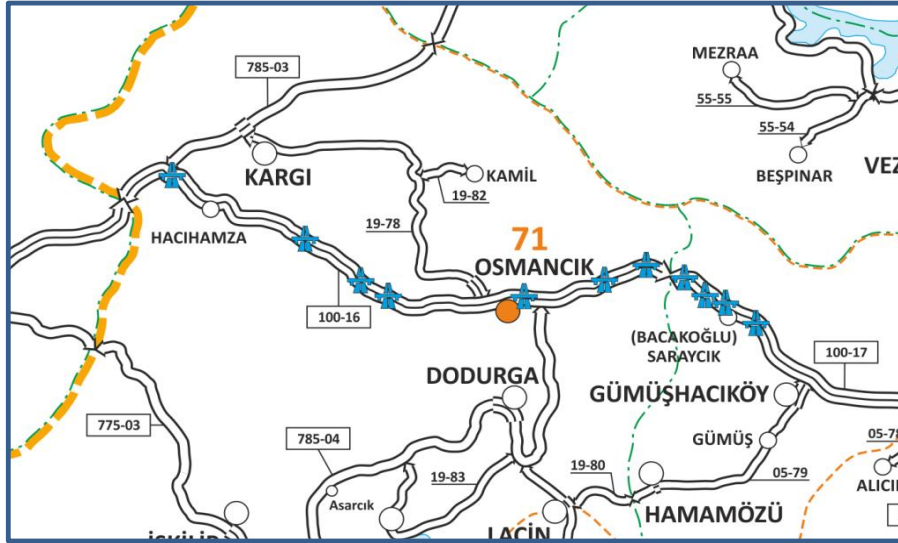

**Yolun Uzunluğu :** 411 m

**İhale Bedeli :** 28.800.500 TL

**Toplam İhale Bedeli :** 28.800.500 TL

**Proje Bedeli :** 37.500.000 TL

**Başlama ve Bitiş Tarihleri :** 19.09.2016 – 14.11.2018

**Sene Başı Ödeneği :** 5.000.000 TL

**2017 Toplam İmalat :** 4.660.635 TL

**2017 Yılı Harcanan :** 2.160.635 TL

**Toplam Harcama :** 2.160.635 TL

**Fiziksel Gerçekleşme :** % 6

**2017 Yılı Par. Hed. Gerç. :** % 48

## Tarihi Koyunbaba Köprüsü




<b>Yolun Uzunluğu :</b>	<b>250 m</b>
<b>İhale Bedeli :</b>	<b>5.902.850 TL</b>
<b>Toplam İhale Bedeli :</b>	<b>5.902.850 TL</b>
<b>Proje Bedeli :</b>	<b>8.500.000 TL</b>
<b>Başlama ve Bitiş Tarihleri</b>	<b>08.11.2013 –12.06.2018</b>
<b>2016 Sonu Toplam Harcama :</b>	<b>3.100.305 TL</b>
<b>Sene Başı Ödeneği :</b>	<b>4.000.000 TL</b>
<b>2017 Toplam İmalat :</b>	<b>514.902 TL</b>
<b>2017 Yılı Harcanan :</b>	<b>514.902 TL</b>
<b>Toplam Harcama :</b>	<b>3.615.207 TL</b>
<b>Sözl. Fiy. İle Yap.Top. İş Tutarı :</b>	<b>2.000.347 TL</b>
<b>Fiziksel Gerçekleşme :</b>	<b>% 43</b>
<b>2017 Yılı Par. Hed. Gerç. :</b>	<b>% 13</b>

**Proje kapsamında boyu 258 m uzunluğunda olan 1 adet tarihi tek köprü bulunmaktadır.**

**2016 yılında çürütme, yenileme, yüz açma ve döşeme kaldırma çalışmaları yapıldı. Ankara 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü kararıyla revize proje hazırlanması gerekmiş olup hazırlanan yeni revize projeye göre 2017 yılında restorasyon çalışmalarına devam edilecektir. 2018 yılı Eylül ayında çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.**

## PROJE DURUMLARI

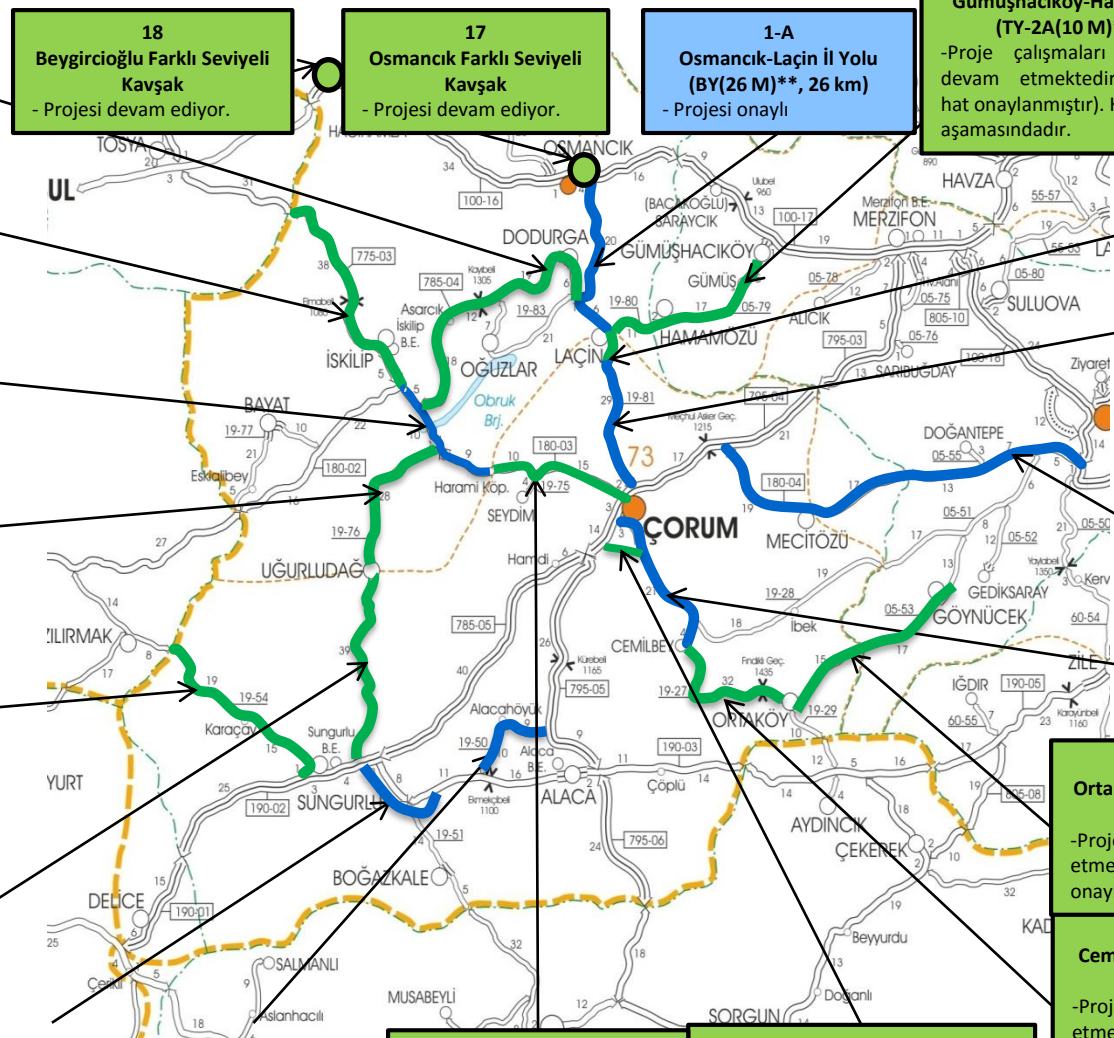

**15**  
**(İskilip-Çorum) Ayr. – (Osmancık-Çorum) Ayr İl Yolu (TY-1A(12 M)\*, 55 km)**  
-Kilavuz planı Genel Müdürlüğümüzce onaylandı.Yıl içinde proje ihalesi yapılacaktır.

**15. Bl. Hd. – İskilip Arası İl Yolu (TY-2A(10 M)\*, 26 km)**  
-Proje çalışmaları devam etmekte olup, Harita ölçümlerinin kontrolü yapılmıştır.

**11**  
**Çorum-İskilip Devlet Yolu 2. Kısım (TY-1A(12 M)\*, 25 km)**  
- Projesi onaylı.

**12**  
**(Çorum-iskilip) Ayr. - Uğurludağ İl Yolu (TY-2A(10 M)\*, 18 km)**  
-Kesin proje çalışmaları emanet olarak devam etmektedir.

**7**  
**Sungurlu-Karaçay-15.Bl.Hd. İl Yolu (TY-2A(10 M)\*, 32 km)**  
-Harita alım çalışmaları tamamlanmıştır. Proje ihalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

**6**  
**Sungurlu-Uğurludağ İl Yolu (TY-2A(10 M)\*, 38 km)**  
-Proje çalışmaları ihaleli olarak devam ediyor. (Cezalı olarak çalışmaktadır.) 2017 yıl sonu itibari ile bitirilecektir.

**13**  
**(Zile-Çekerek) Ayr.-Alaca-(Çorum-Sungurlu) Ayr. İl Yolu Sungurlu Baraj Varyantı (BY(25 M)\*\*, 11 km)-Projesi Onaylı.**

**18**  
**Beygircioğlu Farklı Seviyeli Kavşak**  
- Projesi devam ediyor.

**17**  
**Osmancık Farklı Seviyeli Kavşak**  
- Projesi devam ediyor.

**1-A**  
**Osmancık-Laçın İl Yolu (BY(26 M)\*\*, 26 km)**  
- Projesi onaylı

**2**  
**Gümüşhacıköy-Hamamözü-Laçın (TY-2A(10 M)\*, 11 km)**  
-Proje çalışmaları ihaleli olarak devam etmektedir. (Yatay-düşey hat onaylanmıştır). Kesin proje onay aşamasındadır.

**16**  
**Kırkdilim Geçişi (TY-2A (10 M)\*, 2,5 km)**  
-Projesi Genel Müdürlüğümüzce onaylanmıştır.

**Çorum-Eymir Arası İl Yolu (BY(26 M)\*\*, 18 km)**  
- Projesi onaylı

**3**  
**(Merzifon-Çorum) Ayr.-Mecitözü-(Amasya-Turhal) Ayr. Yolu (BY(26 M)\*\*, 36 km)**  
-Projesi onaylı

**4**  
**Çorum-Cemilbey İl Yolu (TY-2A(10 M)\*, 22 km)**  
-Projesi onaylı.

**8**  
**Ortaköy-Göynücek İl Yolu (TY-2A(10 M)\*, 36 km)**  
-Proje çalışmaları ihaleli olarak devam etmektedir. 2017 yıl sonu itibarıyla onaylanması planlanmaktadır.

**5**  
**Cemilbey-Ortaköy İl Yolu (TY-2A(10 M)\*, 36 km)**  
-Proje çalışmaları ihaleli olarak devam etmektedir.(Yatay-düşey hat onaylanmıştır.) 2017 yılı Eylül ayı itibarıyla onaylanması planlanmaktadır.

**10**  
**(Çorum-Alaca) Ayr.-Alacahöyük-(Sungurlu-Boğazkale) Ayr. İl Yolu (TY-2A(10 M)\*, 19 km)**  
- Projesi onaylı.

**19**  
**Çorum-İskilip Devlet Yolu 1. Kısım (TY-1A(12 M)\*, 25 km)**  
-Proje eksiklikleri tamamlanmaktadır.


**14**  
**(Çorum-Sungurlu) Ayr.-Cemilbey İl Yolu (TY-16 M)\*, 4 km)**  
- Emanet olarak hazırlanan Yatay düşey hat Gn. Müd. onaylanmıştır.

## Alaca Belediyesinin İçme Suyu Yapım İşİ



PROJENİN YERİ	PROJENİN YERİ ÇORUM İLİ ALACA BELEDİYESİ
PROJENİN AMACI	ALACA BELEDİYESİNİN İÇMESUYU YAPIM İŞİ
İhale Tarihi	25.05.2016
Sözleşme Tarihi	25.08.2016
Yer Teslimi (İşe Başlama)	25.08.2016
Ana Sözleşme	10.229.263,00 TL
İşin Bitiş Tarihi	07.01.2018
Nakdi Gerçekleşme	% 38
Fiziki Gerçekleşme	% 45
Süre Uzatımı	-
Bugüne Kadar Yapılan Gerçekleşme	3.850000 TL İŞ DEVAM EDİYOR

## Oğuzlar Belediyesinin İçme Suyu İhtiyacının Karşlanması İçin 3 Adet Depo Yapım İşi

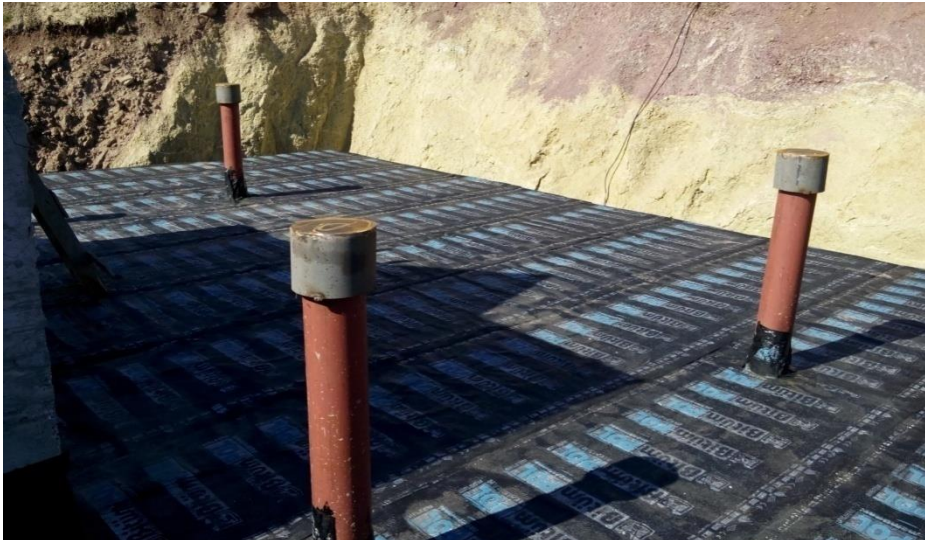

<b>PROJENİN YERİ</b>	<b>Projeni Yeri</b> Çorum İli Oğuzlar Belediyesi İçmesuyu Yapım İşi
<b>PROJENİN AMACI</b>	Oğuzlar Belediyesinin İçmesuyu İhtiyacının Karşlanması İçin 3 Adet Depo Yapım İşi
<b>İhale Tarihi</b>	2016
<b>Sözleşme Tarihi</b>	30.06.2016
<b>Yer Teslimi (İşe Başlama)</b>	15.07.2016 - 120 GÜN SÜRELİ
<b>Ana Sözleşme</b>	720.250 TL
<b>İşin Bitiş Tarihi</b>	12.11.2016
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	% 94
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	% 100
<b>Süre Uzatımı</b>	-
<b>Bugüne Kadar Yapılan Gerçekleşme</b>	678.000TL



## Dodurga İlçesinin İçmesuyu Depo İhtiyacının Karşlanması




Projenin Yeri	Projenin Yeri Çorum İli ( Dodurga ) İlçesi İçmesuyu Depo İnşaatı Yapımı İşi
Projenin Amacı	Dodurga İlçesinin İçmesuyu Depo İhtiyacının Karşlanması
İhale Tarihi	21.03.2017
Sözleşme Tarihi	28.04.2017
Yer Teslimi	12.05.2017
Ana Sözleşme	557.274 TL
İşin Bitiştirili	28.11.2017
Nakdi Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 10
Süre Uzatımı	İş Devam Ediyor.

## ( Osmancık ) İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı İşi



Projenin Yeri	Projenin Yeri Çorum İli (Osmancık) İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı İşi
Projenin Amacı	Osmancık İlçesinin Atıksu Arıtma Şebeke İhtiyacının Karşlanması
İhale Tarihi	21.09.2016
Sözleşme Tarihi	28.11.2016
Yer Teslimi	12.12.2016
Ana Sözleşme	15.072.337.32 TL
İşin Bitiştirili	03.08.2019
Nakdi Gerçekleşme	% 32
Fiziki Gerçekleşme	% 37
Süre Uzatımı	İş Devam Ediyor.
Bugüne Kadar Yapılan Gerçekleşme	4.802.000 TL

## Çorum Alaca Belediyesinin Atıksu Arıtma Tesisin Projesi Yapım İşi

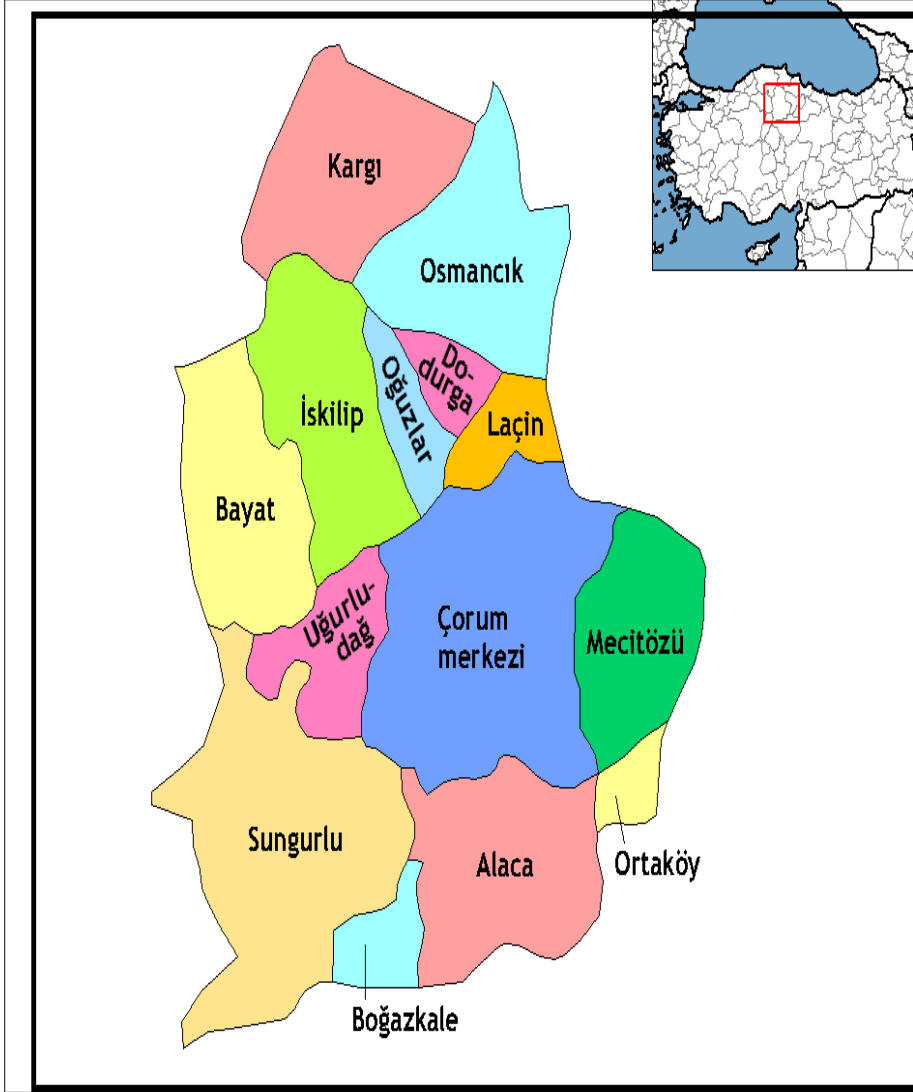

Projenin Yeri	Projenin Yeri Çorum Alaca Belediyesi
Projenin Amacı	Çorum Alaca Belediyesinin Atıksu Arıtma Tesisin Projesi Yapım İşi
İhale Tarihi	-
Sözleşme Tarihi	30.11.2015
Yer Teslimi (İşe Başlama)	17.12.2015
Ana Sözleşme	125.000 TL
İşin Bitiştarihi	13.06.2016
Nakdi Gerçekleşme	% 58
Fiziki Gerçekleşme	% 65
Süre Uzatımı	180 Gün Süreli İş -C- Etabı Devam Ediyor.
Bugüne Kadar Yapılan Gerçekleşme	72.500 TL



## İçme Suyu Tesisi Yapımı

Program Adı	Toplam İş Adedi	Tamamlanan (Adet)	İnşaatı Devam Eden (Adet)	İhale Aşamasında (Adet)	Projesi Devam	Ödenek Tutarı (TL)	Fiziki Gerçekleşme
2016 Yılı İl Özel İdaresi Programından Kalan	21	16	5			3.522.958	%76
2016 Yılı Köydes Programından Kalan	1	1				45.968	%100
2017 Yılı İl Özel İdaresi Programı (İller Bankası Borçlanma Yoluyla)	41	8	33			4.081.763	%20
2017 Yılı İl Özel İdaresi Programı	5		1	2	2	271.400	%10
2017 Yılı Köydes Programı	81	9	65	5	2	7.085.523	%14
<b>Toplam</b>	<b>149</b>	<b>34</b>	<b>104</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>15.007.612</b>	<b>%22</b>

## İçme Suyu Tesisi Yapımı



İçme suyu tesisi yatırım programı kapsamında toplam **149 adet** iş programlanmıştır. İl Özel İdaresi, KÖYDES ve Bakanlık programından ayrılan ödenek tutarı **15.007.612 TL**'dir. Ortalama fiziki gerçekleşme oranı **%22**' dir.

## Kanalizasyon Tesisi Yapımı

Program Adı	Toplam İş Adedi	Tamamlanan (Adet)	İnşaata Devam Eden	İhale Aşamasında	Ödenek Tutarı	Fiziki Gerçekleşme
2016 Yılı İl Özel İdaresi Programından Kalan	3	3		-	444.628,00	%100
2017 Yılı İl Özel İdaresi Programı	148	60	86	2	13.293.652,00	%40
<b>Toplam</b>	<b>151</b>	<b>63</b>	<b>86</b>	<b>2</b>	<b>13.738.280,00</b>	<b>%41</b>



## Asfalt Yapımı

Program Adı	Asfalt (Km)		Tamamlanan (Km)	İnşaatı Devam Eden (Km)	Ödenek Tutarı (TL)	Fiziki Gerçekleşme
2017 yılı il özel idaresi programı ve 2017 köydes programı	1 Kat	568,4	104	464,4	45.829.857,00	%19
	2 Kat	10,5		10,5		%10
2015 Ve 2016 İller Bankası Hibe	1 Kat	20		20	3.000.000,00	%10
<b>Toplam</b>		<b>598,9</b>	<b>104</b>	<b>494,9</b>	<b>48.829.857,00</b>	<b>%17</b>

Asfalt yatırımları kapsamında, **588,4 km 1.kat asfalt, 10,5 km 2.kat asfalt toplam 598,9 km** asfalt yapımı programlanmış olup, **il Özel idaresi, Köydes ve İller bankası** bütçesinden olmak üzere ayrılan toplam ödenek tutarı **48.829.857,00 TL**'dir. Dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme **% 17**'dir.





## Kilitli Parke Yapım İşi

Program Adı	Toplam İş Adedi	Tamamlanan (Adet)	İnşaata Devam Eden (Adet)	İhale Aşamasında (Km)	Ödenek Tutarı	Fiziki Gerçekleşme
2017 İl Özel İdaresi	457	177	280		30.184.600,60	%39
2016 Ek Bütçe	7	7			600.456,16	%100
2017 Köydes	58	20	38		2.809.743,50	%34
2015 Köydes	1			1	23.382,50	%10
<b>Toplam</b>	<b>523</b>	<b>204</b>	<b>318</b>	<b>1</b>	<b>33.618.182,76</b>	<b>%39</b>

Beton parke yatırım programı kapsamında toplam **523** adet iş programlanmış olup, **İl Özel İdaresi** ve **KÖYDES** bütçelerinden ayrılan toplam ödenek tutarı **33.618.182,76 TL**'dir. Dönem sonu itibariyle fiziki gerçekleşme **% 39**' dur.



## Sanat yapısı Çalışmaları

## Yol Altyapı İyileştirme Çalışmaları

Sanat yapısı yatırımı kapsamında **62 adet** iş programlanmış olup, **İl Özel İdaresi** ve **KÖYDES** bütçesinden ayrılan toplam ödenek **5.016.849,00 TL**'dir. Dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme **% 24**' tür.



## Tarımsal Sulama Yapımı

Program Adı	Toplam İş Adedi	Tamamlanan (Adet)	İnşaatı Devam Eden	İhale Aşamasında (Adet)	Projesi Tamamlanan (Adet)	Projesi Devam Eden	Ödenek Tutarı (TL)	Fiziki Gerçekleşme
2015 İl Özel İdaresi Ek	1	-	1	-	-	-	1.328.981,28	%10
2016 Yılı İl Özel İdaresi Programı	1	1	-	-	-	-	225.680,08	%100
2016 Köydes	1	1	-	-	-	-	51.530,30	%100
2017 İl Özel İdaresi Programı	62	13	36	12	-	1	12.091.000,00	%20
2017 Bakanlık Programı	1	-	-	-	1	-	61.710,55	%10
2017 Köydes Programı	3	-	1	2	-	-	399.419,00	%10
<b>Toplam</b>	<b>69</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14.128.321,21</b>	<b>%22</b>

2017 yılı Tarımsal Sulama Tesisi yatırım programı kapsamında 69 adet iş programlanmış toplam ödenek tutarı 14.128.321,21 TL' dir. Dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme % 22' dir.



## Kamu Bina Yapım Ve Onarımı

Konusu	Toplam Proje	Biten (Adet)	Devam Eden (Adet)	İhale Aşamasında	Projesi Devam Eden	Ödenek Tutarı (TL)	Fiziki Gerçekleşme
Milli Eğitim Müdürlüğü	76	2	48	15	11	65.086.015,72	%10
Sağlık Müdürlüğü	11	0	8	3	0	9.067.536,30	%10
Emniyet Müdürlüğü	5	2	1	1	1	684.463,20	%10
Aile Ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü	4	0	3	0	1	2.688.054,43	%10
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	1	0	1	0	0	5.422.175,00	%10
Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü	14	8	2	1	3	2.097.758,74	%57
<b>Toplam</b>	<b>111</b>	<b>12</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>85.046.003,72</b>	<b>%11</b>



## Çevre Düzenleme Ve Diğer Yapım İşleri

Program Adı	Toplam İş Adedi	Tamamlanan (Adet)	İnşaata Devam Eden (Adet)	İHALE AŞAMASINDA (Adet)	Ödenek Tutarı (Tl)	Fiziki Gerçekleşme
Köylere Çocuk Oyun Grubu Yapımı	245	40	205	-	1.829.520,00	%20
Diğer Programlar	28	10	17	1	7.116.263,00	%38
<b>Toplam</b>	<b>273</b>	<b>50</b>	<b>222</b>	<b>1</b>	<b>8.945.783,00</b>	



## (Yapım ve Sosyal içerikli projeler)

No	Proje Adı	Proje Adedi	Devam Eden	Ödenek ( TL)	İşin Durumu	Fiziki Gerçekleşme
1	Boğazkale Hattuşa Ören Yeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Çevre Düzenleme İşi	1	1	479.168,00	Devam Ediyor	%85
2	27 Adet Spor Kulübüne Malzeme Alımı	1	1	90.000,00	Devam Ediyor	%90
3	İlimizde Bulunan Engelliler İçin Hediye Edilmek Üzere Tam Donanımlı Akülü Engelli Araba Alınması (26 Adet)	1	1	79.924,00	Devam Ediyor	%80
4	İl Ve İlçelerde Bulunan Kütüphanelere Kitap Alımı	1	1	50.000,00	Devam Ediyor	%45
	<b>Toplam</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>699.092,00</b>		<b>%74</b>

## Çevre Düzenleme – Restorasyon Ve Turizm Altyapı İşleri


No	Proje Adı	Proje Adedi	Devam Eden	Ödenek ( TL)	İşin Durumu	Fiziki Gerçekleşme
1	Kapanan 22 Adet Belde Belediyesinde İmar Revizyonlarının Yapımı	5	5	950.000,00	Devam Ediyor	%40
2	Köy Meydanı Çevre Düzenlemesi Projesi Hazırlanması İşi	5	5	100.000,00	Devam Ediyor	%30
3	Kapanan 22 Adet Belde Belediyesinde İmar Kanununun 18. Maddesinin Uygulanması İşi	4	4	300.000,00	Devam Ediyor	%30
4	İdaremiz Sorumluluk Alanında Bulunan Bütün Köylerin Yaklaşık %10 'Unda Köydes Kapsamında Cbs Verilerinin Oluşturulması	1	1	İdari İmkanlarla Yapılacak	İdari İmkanlarla Yapılacak	%30
5	İlimizdeki Tescilli Tescilsiz Taşınmaz Kültür Varlıklarının Röleve, Restorasyon Ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması İşi	6	6	Taşınmaz Kültür Varlıkları Hesabından	Devam Ediyor	%30
	<b>Toplam</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>%35</b>

### Obruk - Dutludere Sulaması



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>OBRUK-DUTLUDERE SULAMASI</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Osmancık</b>
<b>İşe Başlama – Süre Uzatımlı İş Bitiş Tarihi</b>	<b>25.08.2011- 02.08.2017</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>39.851.120 TL</b>
<b>Yatırım Durumu</b>	<b>İnşaat devam ediyor.</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>33.479.694 TL</b>
<b>2017 Program Yılı Ödeneği</b>	<b>7.999.999 TL</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	<b>3.364.896 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>%47</b>

## Tımarlı Sulaması 2. Kısım İnşaatı

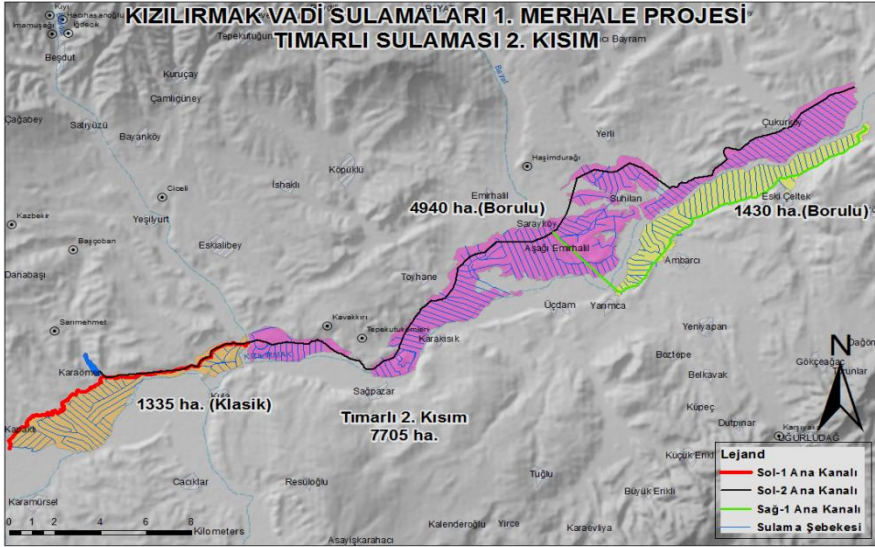

<b>Projenin Adı</b>	<b>Tımarlı Sulaması 2. Kısım</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Çankırı Ve Çorum İlleri</b>
<b>İşe Başlama – Süre Uzatımlı İş Bitiş Tarihi</b>	<b>12.06.2015-08.03.2018</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>136.500.000 TL</b>
<b>İşin Kapsamı</b>	<b>77.050 Da Arazi Sulanacaktır. (63.700 Da'ı Çorum İlinde) Klasik Kanal Ve Borulu Sistemde Olacaktır.</b>
<b>Yatırım Durumu</b>	<b>İnşaatı Devam Etmektedir.</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>39.172.764 TL</b>
<b>2017 Program Yılı Ödeneği</b>	<b>19.500.000 TL</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	<b>17.538.526 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>% 35</b>



## Koçhisar Sulaması İnşaatı



<b>Projenin Adı</b>	<b>Koçhisar Sulaması</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Alaca</b>
<b>İşe Başlama – Süre Uzatımlı İş Bitiş Tarihi</b>	<b>20.05.2014 – 12.01.2019</b>
<b>Revize İhale Bedeli</b>	<b>69.510.047 TL</b>
<b>Yatırım Durumu</b>	<b>İnşaat devam ediyor.</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>41.317.411 TL</b>
<b>2017 Program Yılı <u>Revize</u> Ödeneği</b>	<b>17.459.916 TL</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması (SON)</b>	<b>17.459.916 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>% 59</b>

## Çorum-Hatap İçmesuyu Projesi



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>YENİHAYAT BARAJI DERİVASYONLARI İKMALİ</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Merkez</b>
<b>İşe Başlama – Bitiş Tarihi</b>	<b>27.07.2015 - 26.06.2017</b>
<b>Revize İhale Bedeli</b>	<b>8.652.329 TL</b>
<b>Yatırım Durumu</b>	<b>İnşaat tamamlanmıştır.</b>
<b>İşin Kapsamı</b>	<b>Çorum İline Yıllık 2,9 hm<sup>3</sup> içme suyu sağlayacaktır. İşin toplamında 4 Adet regülatör ve 20.850 m isale hattı yapılacaktır.</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>9.772.622 TL</b>
<b>2017 Program Yılı Ödeneği</b>	<b>857.374TL</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	<b>287.438 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>% 100</b>




<b>Projenin Adı»</b>	<b>Köprübaşı Göleti Sulaması Ve Derivasyon Tesisleri İnşaatı</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Mecitözü</b>
<b>Revize İhale Bedeli</b>	<b>19.877.422 TL</b>
<b>İşe Başlama</b>	<b>27.06.2014</b>
<b>Süre Uzatımlı Bitiş Tarihi</b>	<b>20.08.2017</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	<b>1.600.525 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>% 92</b>



<b>Projenin Adı</b>	<b>Figani Ve Kozören Sulamaları İnşaatı</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Mecitözü</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>2.376.000 TL</b>
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	<b>14.07.2014</b>
<b>Süre Uzatımlı Bitiş Tarihi</b>	<b>06.04.2017</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 88</b>



Projenin Adı	Ortaköy Daniş Göleti Sulaması
Projenin Yeri	Ortaköy
İhale Bedeli	2.155.255 TL
İşe Başlama Tarihi	28.06.2016
İş Bitiş Tarihi	20.09.2017
2017 Yılı Nakdi Harcaması	406.697 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 100

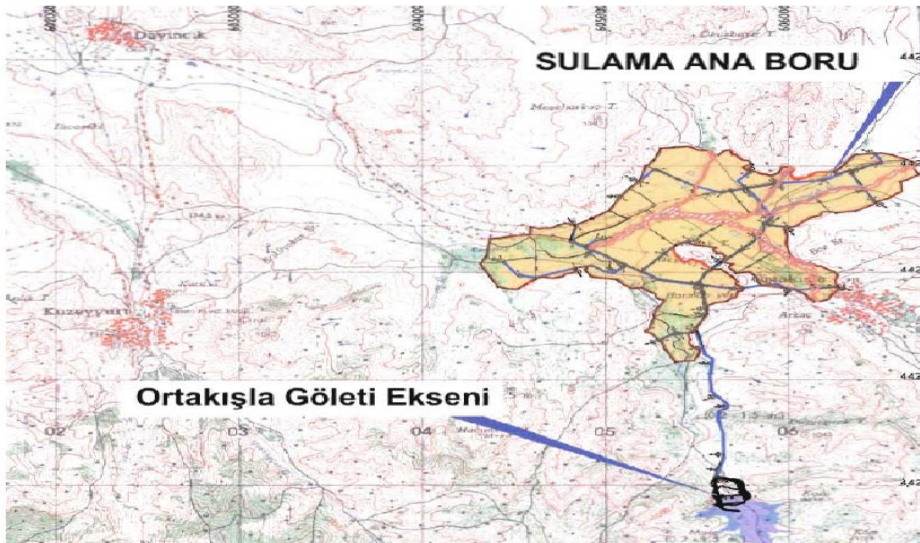

Projenin Adı	Çorum Sungurlu Ortakışla Göleti Sulaması İnşaatı
Projenin Yeri	Sungurlu Ortakışla Köyü
İhale Bedeli	1.641.144 TL
İşe Başlama Tarihi	23.12.2016
İş Bitiş Tarihi	18.10.2017
2017 Yılı Nakdi Harcaması	1.094.173 TL
Fiziki Gerçekleşme	%1

## GÖLETLER

Çorum Merkez Şeyhmustafa Göleti İkmali



Projenin Yeri	Merkez
Keşif Bedeli	21.000.000 TL
İşe Başlama Tarihi	2017
İşin Bitiş Tarihi	2018
Yatırım Durumu	İhale Aşamasında
2017 Program Yılı Ödeneği	- TL
Fiziki Gerçekleşme	-



Sungurlu Aşağıfındıklı Göleti İkmali

Projenin Adı	Sungurlu Aşağıfındıklı Göleti İkmali
Projenin Yeri	Sungurlu
İşe Başlama – Bitiş Tarihi	07.02.2017 – 09.10.2018
İhale Bedeli	2.999.998 TL
2017 Program Yılı Ödeneği	350.000 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı	% 0

## GÖLETLER



<b>Projenin Yeri</b>	Mecitözü
<b>Keşif Bedeli</b>	7.000.000 TL
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	2017
<b>İşin Bitiş Tarihi</b>	2018
<b>Yatırım Durumu</b>	İhale Edilecek
<b>2017 Program Yılı Ödeneği</b>	800 TL
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	-



<b>Projenin Adı</b>	Bayındır Göleti İkmali İnşaatı
<b>Projenin Yeri</b>	Mecitözü
<b>İşe Başlama – Süre Uzatımlı Bitiş Tarihi</b>	24.06.2015 – 22.08.2017
<b>İhale Bedeli</b>	2.519.000 TL
<b>Yatırım Durumu</b>	İnşaatı devam etmektedir.
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	1.231.276 TL
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	% 65

## GÖLETLER



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>KUNDUZLU GÖLETİ İNŞAATI</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Bayat</b>
<b>İşe Başlama –Bitiş Tarihi</b>	<b>28.02.2014 – 02.08.2017</b>
<b>Revize İhale Bedeli</b>	<b>20.543.173TL</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	<b>3.297.164 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>% 99</b>



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>ORTAKIŞLA GÖLETİ İNŞAATI</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Sungurlu</b>
<b>İşe Başlama – Süre Uzatımlı Bitiş Tarihi</b>	<b>03.07.2015 - 20.06.2017</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>3.393.000 TL</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	<b>450.799 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>%36</b>

## GÖLETLER



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>İNCESU GÖLETİ İNŞAATI</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Osmançık</b>
<b>İşe Başlama – Süre Uzatımlı Bitiş Tarihi</b>	<b>21.07.2015 – 01.10.2017</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>11.470.000 TL</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	<b>3.407.002 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>%49</b>



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>DEREKARGIN GÖLETİ İNŞAATI</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>İskilip</b>
<b>İşe Başlama – Bitiş Tarihi</b>	<b>07.09.2015 – 12.10.2017</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>11.914.614 TL</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	<b>3.777.677 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>%47</b>



## GÖLETLER



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>DEREBOĞAZI GÖLETİ İNŞAATI</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Osmancık</b>
<b>İşe Başlama – Süre Uzatımlı Bitiş Tarihi</b>	<b>28.04.2015-02.08.2017</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>6.296.156 TL</b>
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	<b>1.301.344 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>%54</b>



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>OĞUZLAR GÖLETİ İNŞAATI</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Oğuzlar</b>
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	<b>30.12.2015</b>
<b>Süre Uzatımlı Bitiş Tarihi</b>	<b>21.08.2017</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>13.779.992 TL</b>
<b>2017 Program Yılı Ödeneği</b>	<b>2.355.734 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>%17</b>

## GÖLETLER



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>SUNGURLU GÖLETİ İNŞAATI</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Sungurlu</b>
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	<b>20.03.2017</b>
<b>İş Bitiş Tarihi</b>	<b>14.12.2019</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>28.102.914 TL</b>
<b>2017 Program Yılı Ödeneği</b>	<b>1.000.000 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	<b>0 %</b>

## REKREASYON İŞLERİ



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>Gökpınar Barajı Çevre Düzenlemesi Ve Peyzaj İşleri İnşaatı</b>
<b>Projenin Yeri</b>	Alaca
<b>Başla – Bitiş Tarihi</b>	20.11.2015-12.07.2017
<b>İhale Bedeli</b>	6.785.000 TL
<b>İşin Kapsamı</b>	Hitit Gökpınar Barajı çevresinde peyzaj düzenlemesi
<b>Yatırım Durumu</b>	İnşaat devam ediyor.
<b>2017 Program Yılı Ödeneği</b>	660.000 TL
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	%65



<b>PROJENİN ADI</b>	<b>Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi Ve Kızılırmak Osmancık Geçişi T. K. İnşaatı</b>
<b>PROJENİN YERİ</b>	Osmancık
<b>İşe Başlama – Bitiş Tarihi</b>	26.10.2015-03.01.2018
<b>İhale Bedeli</b>	45.923.500 TL
<b>2017 Yılı Nakdi Harcaması</b>	22.061.787 TL
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 29

## TAŞKIN KORUMA ÇALIŞMALARI



Çorum Uğurludağ İlçe Merkezi Kızıldere  
Ve Kurudere Taşkın Koruma



Çorum Merkez Sülüklü Deresi İkmal  
Ve Fitne Deresi Deplasmanı İnşaata



Çorum Merkez Sülüklü Deresi İkmal  
Ve Fitne Deresi Deplasmanı İnşaata



Çorum Bayat İlçe Merkezi Yerleşim Yeri ve  
Arazilerinin Bayat Çayı Taşkınlarından Kor

## Orman Yolları



Faaliyet Adı	Program (Km)	Gerç. (Km)	%
Yeni Yol	29	15	51
Büyük Onarım	18	11	61
Üst Yapı	33	0	0
Sanat Yapısı	36	0	0
Yangın Emniyet Yol Yapımı	10	3	30
Yangın Emniyet Yolu Bakımı	111	58	52
Kule Kulube Yolu Bakımı	19	9	47
Traktör Yolu Yapımı	12	3	25
Üretim Yolu Bakımı	1.160	154	13

## İnşaat Çalışmaları




İşin Adı	Yeri	Ödeneği (TL)	Açıklama
Yangın Kule Ve Kulubesi (Yeni)	Çorum	160.000	Tamamlandı
Depo Binası(yeni)	Çorum (Kamil)	100.000	Tamamlandı
Yangın Kule Ve Kulubesi (Büyük Onarım )	Çoru (Ardıç)	40.000	İhalesi Yapıldı
Yangın Kule Ve Kulubesi (Büyük Onarım )	Çoru (İnegöl)	40.000	İhalesi Yapıldı
Yangın Kule Ve Kulubesi (Büyük Onarım )	Çoru (Kartal)	40.000	İhalesi Yapıldı
Yangın Havuzu Ve Göleti	İskilip	60.000	İhalesi Yapıldı

## Orman Bakım Çalışmaları



Faaliyet Adı	Program(Ha)	Gerçekleşme (Ha)	%
Doğal Gençleştirme	13		
Gençlik Bakımı	1.203	873	72
Sıklık Bakımı	2.510	998	39
Koruya Tahvil	3.000	1.020	34
Kültür Bakımı	106	35	33

## Orman Bakım Çalışmaları

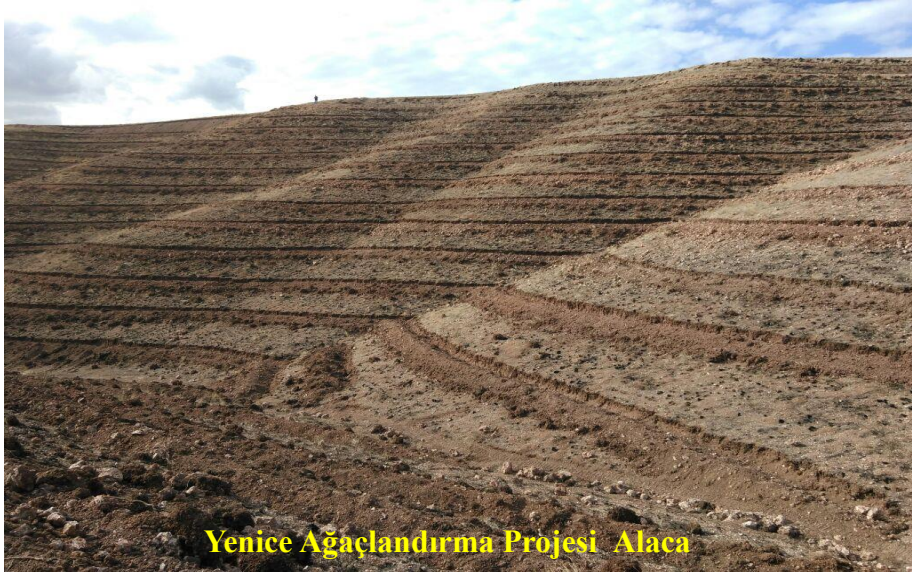

Faaliyet Adı	Program (Ha)	Gerç. (Ha)	%
Ağaçlandırma Tesis	700	610	87
Ağaçlandırma Bakım	2.400	1.500	62
Toprak Muhafaza ve Erozyon Kont.Tesis	5.000	2.650	53
Toprak Muhafaza ve Erozyon Kont.Bakım	11.500	7.200	62
Rehabilitasyon Tesis (Silvikültür ödenekli)	864	315	36
Rehabilitasyon Tesis (Ağaçlandırma ödenekli)	582		
Rehabilitasyon Bakım	480	14	
Mera Islahı Tesis	150		



## Erozyon Önleme Çalışmaları



Gökçedoğan Dere Islah Çalışması

## Maden Sahaları Rehabilitasyon Çalışmaları



Bayat Şefliği, Yoncalı Köyü,



Bayat Şefliği, Yoncalı Köyü



Bayat İlçesi Linyit Maden Sahası Rehabilitasyonu



**OR-KÖY Çalışmaları kapsamında 2003-2016 döneminde;**

**Orman köylerinde yaşayan 2.312 aileye**

**22,3 Milyon TL ferdi proje kredi ve desteği sağlanmıştır.**

**2017 yılında da ise 150 aileye 1,5 milyon TL kredi ve hibe desteği sağlanacaktır.**



**Or-Köy ödeneklerinin arttırılması, orman köylülerimizin refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.**

**Arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için**

- Merkez ilçe Osmaniye Köyü'nde, **200 dekar** alanda
- Dodurga ilçe merkezinde **110 dekar** alanda
- Bayat ilçesi, Toyhane Köyü'nde, **200 dekar** alanda
- Alaca ilçesi, Küre Köyü'nde, **293 dekar** alanda

**4 bal ormanı kurulmuştur.**



**2017 Yılında Ortaköy İlçemiz köylerinde 780 dekar alanda, yaklaşık 300.000 TL proje tutarında Bal Ormanı Projesi hayata geçirilecektir.**

# ORMANCILIK



# ORMANCILIK



Proje Adı	İLİ	Saha Adı	Faaliyet Grubu	Faaliyet Adı	İhale Bedeli KDV Hariç	2017 Program Yılı Ödeneği	Açıklama
Milli Park	Çorum	Sıklık TP.	Altyapı ve Tesisler	Fauna Tanıtım Alanı Yapımı	974.752,94	355.000	Yıllara Sari ihalesi 29.09. 2015 tarihinde yapıldı. İşe 05.04.2016 tarihinde başlanmış olup, iş artımı nedeniyle süre uzatımı verilmiş olup, iş tamamlanmıştır.
Milli Park	Çorum	Sıklık TP.	Çevre Düzenlemesi	-		80.000	Su depolarının dış cephelerinin ahşap kaplama yapılması, Dik yamaçlara ahşap korkuluk yapılması, Muhtelif çevre düzenleme işlerinin yapılması planlanmaktadır.
Milli Park	Çorum	Çatak T.P.	Altyapı ve Tesisler	Su ve Elektrik Tesisatı		200.000	Su deposu, Su isale hattı ve çeşmelerin yapılması, Mevcut trafonun yenilenmesi, enerji nakit hattının yeraltına alınması, Misafirhane, 2 adet WC ve satış büfesinin bakım, onarımlarının yapılması, Menfez yapılması işleri planlanmaktadır.
				<b>TOPLAM</b>		<b>580.000</b>	

Proje Adı	İLİ	Saha Adı	Faaliyet Grubu	Faaliyet Adı	İhale Bedeli	2017 Yılı Kalan Para	Açıklama
Milli Park	Çorum	Sıklık TP.	Etüd Proje	Gelişme Planı Yapımı	45.843,00	4.584	Sıklık Tabiat Parkının Gelişme Planı Revizyonu yapımı .
Milli Park	Çorum	Boğazköy-Alacahöyük MP.	Etüd Proje	Gelişme Planı Yapımı	74.340,00	29.736	Boğazköy Alacahöyük TMP' nın Uzun Devreli Gelişme Planının yapımı işi.
Milli Park	Çorum	-	Etüd Proje	Biyocoşetlilik envanteri	144.904,00	57.962	Biyocoşetlilik ve Envanter çalışmaları işi
				<b>TOPLAM</b>	<b>265.087,00</b>	<b>92.282,30</b>	



<b>MERKEZ ATLETİZM PİSTİ</b>	
<b>Yeri</b>	<b>ÇORUM</b>
<b>Tarihi</b>	<b>2014</b>
<b>Proje Tutarı</b>	<b>5.753.680,00</b>
<b>Küm. Fiz. Gerçekleşme</b>	<b>% 80</b>
<b>Açıklamalar</b>	<b>Pist çalışmaları ve tribün inşaatı devam ediyor. Saha betonları dökülüyor..</b>



<b>ALACA İLÇESİ GENÇLİK MERKEZİ</b>	
<b>Yeri</b>	<b>Alaca</b>
<b>Tarihi</b>	<b>2016</b>
<b>Toplam Proje Tutarı</b>	<b>3.286.630</b>
<b>Gerçekleşme Oranı</b>	<b>% 60</b>
<b>Açıklamalar</b>	<b>İnşaat Devam Ediyor.</b>



## Sungurlu İlçesi Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası

<b>Yeri</b>	<b>Sungurlu</b>
<b>Tarihi</b>	<b>2016</b>
<b>Proje Tutarı</b>	<b>1.179.941,00</b>
<b>Gerçekleşme Oranı</b>	<b>% 90</b>
<b>Açıklamalar</b>	<b>Saha Yapımı Tamamlandı. Tribün İnşaatı Devam Ediyor.</b>



## Mecitözü İlçesi Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası

<b>Yeri</b>	<b>Mecitözü</b>
<b>Tarihi</b>	<b>2016</b>
<b>Proje Tutarı</b>	<b>730.420,00 TL</b>
<b>Gerçekleşme Oranı</b>	<b>%99</b>
<b>Açıklamalar</b>	<b>Geçici Kabule Hazır.</b>



Çorum İskilip Kadıasker Camii Yılları Onarım İşi



Çorum Merkez Ulu Cami Projeleri Çizimi Hizmet Alımı İşi



Merkez Hıdırlık Camii Ve Kerebi Gazi Türbesi Onarım İşi



Çorum Mecitözü Elvan Çelebi Cami Ve Türbesi
